



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2010. júniusában sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” (DDop-2009-2.1.1.D) tárgyú felhívás keretében.

„A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE” című projekt az Európai Unió és az Európai Regionális fejlesztési alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A beruházás 2011. február 08. és 2011. december 31. közötti időszakban kerül megvalósításra.

**Projekt címe:** A Balatoni Bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése

**Projekt száma:** DDop-2009-2.1.1.D

**Pályázó neve:** Balatonföldvár Város Önkormányzata

**Pályázó képviselője:** Hologits Huba

**Pályázat benyújtás dátuma:** 2010.06.28.

**Szerződés hatályba lépése:** 2011.01.28.

**Megvalósítás tervezett kezdete:** 2011.02.08.

**Megvalósítás tervezett befejezése:** 2011.12.31.

**Megítélt támogatás:** 280.000.000.Ft

**Elfogadott projekt összköltség:** 350.000.000 Ft

A közreműködő (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) a fejlesztések végrehajtására 280.000.000 Ft támogatást ítél meg.

A beruházás összköltsége 350.000.000 Ft, a fennmaradó 70.000.000 Ft önrészt Balatonföldvár Város Önkormányzata biztosítja a megvalósításhoz.

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

**A projekt keretében a Balatoni Bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése történik meg, mely során a következő munkálatok valósulhatnak meg:**

Balatonföldváron a Somogyi Béla és Rákóczi Ferenc utcákban - Szántód településhatár és Balatonszárszó településhatár között - burkolat megerősítéssel és szélesítéssel 2200 méter hosszúságban nyitott kerékpár sáv és további 1298 méteren járdával kapcsolt kerékpárút építése történik. A közel 3,3 km hosszú szakaszon kiépül a vízelvezetés műszaki rendszere, mely a biztonságos kerékpározás elengedhetetlen feltétele.

A kerékpárút mentén, két frekventált helyszínen – a kikötőnél és a Fesztivál térnél - pihenőhellyel kiegészített zárható kerékpártárolók létesítése történik. Ezen helyszíneken információs pontok, valamint családbarát parkolóhelyek szintén kialakításra kerülnek. Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében biztosítja a kerékpár szerviz és kerékpárkölcsonzói szolgáltatásokat.

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

*A projekt stratégiai célja Balatonföldvár Város Turisztikai vonzerejének fejlesztése.*

*Operatív célként:*

- ✓ *A kerékpárút kiépítésével, megújításával, a szolgáltatások bővítésével a jelenlegi vendégkör megtartása, új vendégek vonzása;*
- ✓ *A kerékpárút és kapcsolódó szolgáltatások, valamint a település versenypozíciójának javítása;*
- ✓ *Új munkahelyek teremtése;*
  - ✓ *Balatonföldvár külső megítélésének, image-ának emelése - kerültek megfogalmazásra.*

A projekt kivitelezése a nyári turistaszezon zavartalan biztosítása érdekében két szakaszban történik:

I. szakasz: 2011. február 08. - 2011. június 30.

Szántód településhatártól a Fesztivál térig készül el a járdával kapcsolt kerékpárút, valamint a két kerékpártároló építése.

II. szakasz: 2011. szeptember 01. - 2011. december 31.

Fesztivál tértől Balatonszárszó településhatárig nyitott kerékpár sáv készül.

*2011.március*

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

**Kivitelező:**

**Hornyák Út és Mélyépítő Kft.**

2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59.

**Tervezők:**

**Pegasus TERV Építőmérnöki Kft.**

1205 Budapest, Tuba utca 15.

**Szabari Péter** okl. építőmérnök, okl. útépitési szakmérnök

**Hidro Consulting Kft.**

7628 Pécs, Auróra utca 8.

**Dittrich Ernő** okl. építőmérnök, vízmérnöki vezető tervező

**Közreműködő szervezet: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség**

7621 Pécs, Mária u. 3.

A projekt nyitó rendezvénye 2011. március 22-én került megrendezésre. Az alapkőletételt megtisztelte jelenlétével Witzmann Mihály a Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke, és Hlovits Huba Polgármesterrel a Fesztivál téren ünnepélyes keretek között, elhelyezték a kerékpárút alapkövét.



2011. április

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

2011. júniusában szerződésmódosításra került sor. A kivitelezési munkálatok megkezdését követően vált ismertté, hogy a közművek nem a közszolgáltatók által megjelölt nyomvonalon haladnak, ezért az alapszerződés műszaki tartalmát meghatározó terven megjelölt módon és helyen a csapadékelvezető rendszer nem alakítható ki. A meglévő adottságok mellett a csatorna megépítése csak a meglévő aszfaltos útpálya alatt lehetséges. Szükségessé vált a vízepítési munkarész – a helyszíni közmű-adottságokat figyelembe vevő – áttervezése, a módosított tervhez tartozó új költségvetés összeállítása, új nyomvonal kialakítása és ennek nyomán a vízjogi engedély módosítása.

*2011. június*

A tervezett ütem szerint elkészült a balatoni bringakörút I. szakasza Balatonföldváron. A közel 3 és fél km-en megvalósuló beruházásból a terveknek megfelelően elkészült a Szántód településhatár és a Fesztivál tér között 1298 méteren járdával kapcsolt kerékpárút, valamint 406 km-en kerékpárbarát út készült el.

Az első szakasz műszaki átadás-átvétele 2011.július 8-án megtörtént.

A sajtótájékoztatóval egybekötött, ünnepélyes átadásra 2011. július 19-én került sor.

*2011. július*



## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006



Balatonföldvár Város gazdasági-társadalmi fejlődésének meghatározó tényezője a turizmus. A városvezetés egyik alapvető célkitűzése a minőségi

turizmus feltételrendszerének megteremtése. Jelen pályázat keretében a kerékpárút létesítésével, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével, az aktív turizmus feltételeit teremti meg az Önkormányzat, igyekezve ezzel XXI. század színvonalának megfelelő turisztikai szolgáltatásokat nyújtani, és a további fejlesztések alapját megteremteni.



### **Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság





„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

**A kerékpárút építési munkálatok nyári szezont követő kivitelezési munkái a 2011. szeptember 05-én eredményesen megtartott munkaterület átadással kezdődtek meg.**

A nyárutón még üzemelő vendéglátó egységek – üdülők, panziók- zavartalan üzemelésének biztosítása érdekében az építési munkálatok a balatonszárszói oldalon kezdődtek meg a vízepítési munkálatokkal. Az meglévő útpálya É-i, Balaton felőli oldalán kerültek elhelyezésre a tervezett 50\*40-es folyóka elemekkel fedett zárt, csapadékvíz elvezető rendszer.





## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

Ugyanezen szakaszon a kivitelező megkezdte a meglévő útpálya vasút felőli oldalán található kiemelt szegélyek elbontását, ezzel elősegítve az amúgy szűk közlekedési felületen a gépjárművek haladását, és egymás elkerülésének lehetőségét, valamint lehetővé vált az útpálya szélesítésével kapcsolatos további munkavégzés.







## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

Az idő előrehaladtával az építési szakasz más pontjain is megkezdődtek a régi szegélyek bontási munkálatai, valamint az azt követő új szegélyek kialakítási munkálatai.



Fenti munkálatokkal párhuzamosan megkezdődtek a Széchenyi utcától Ny-ra eső útpályába tervezett zárt vízvezető rendszer fektetésével kapcsolatos előkészítő munkálatok, a kijelölt nyomvonalon történő aszfalt rétegek lemarásával.



### **Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

Az átépítési munkák a munkaterület több pontján összehangoltan, szervezeten és az érintett ingatlanok, valamint az úton közlekedők minimális zavarásával történnek. A bontási és építési munkák során az érintett ingatlan bejárók használatát csak a munkavégzés miatti legszükségesebb ideig korlátozzák, a tulajdonosokkal történő előzetes egyeztetést követően.

*2011. szeptember*



**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.




## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

A kerékpárút építési munkák jó ütemben haladnak, ami egyrészt köszönhető a kedvező időjárási körülményeknek, valamint a szorgalmas kivitelezői tevékenységnek.

A Széchenyi utca és a Ny-i strand között elkészült a K-i oldalra tervezett „K” szegély kiépítése, valamint a 40\*50-es útpálya alá kerülő zárt csapadékvíz elvezető rendszer több mint 80%-a. A lefektetett elemek feletti ideiglenes helyreállításokat a kivitelező a munkavégzések ütemében folyamatosan végezte, hogy ezzel is csökkentse a közlekedési problémákat.

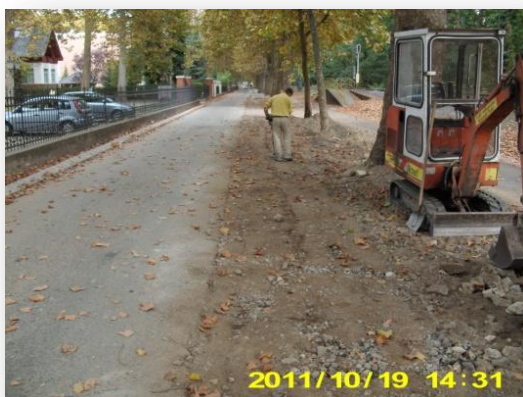

Mivel a nyári szezonnak már vége az építéssel érintett útszakaszon közlekedők száma jelentősen csökkent, ami nagyban könnyítette a kivitelezés menetét.

A kivitelezéssel érintett teljes szakaszára elmondható, hogy a kerékpárút építéssel kapcsolatos alépítményi, csapadékvíz elvezetési munkák, valamint szegélyezési munkák 90%-ban elkészültek.

### **Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

Az útszélesítéssel érintett szakaszokon már az aszfaltozás előkészítő munkák vannak folyamatban. Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, akkor október utolsó hetében



megkezdődhetnek az aszfaltozási munkák.





„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

2011. október

A kerékpárút építési munkák a tervezetteknek megfelelően jó ütemben haladnak. A szegélyépítések 98%-os, az útpályát érintő csapadékvíz építési munkák 95%-os szinten vannak. Megkezdődtek és jó ütemben haladnak a szegélyen kívüli zöldterületek rendezési munkálatai is, főleg a vasút felőli oldalon.

Az aszfaltozással érintett szakaszokon a kivitelező elvégezte a szükséges aszfaltmarási, valamint cementes stabilizációs alépitményi rétegek gépi bedolgozási munkálatait.

A mai napon megkezdődnek a gépi aszfaltozási munkálatok az alsó kiegyenlítő réteg beépítésével. Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, úgy rövid időn belül a tervezettek szerinti felső aszfalt kopóréteg beépítése is megkezdődik.

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság





## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

Továbbá folytatódik az útpályán kívül területeken még vissza lévő csapadékvíz elvezető rendszerek szakaszainak építése.

*2011. november*

Az építési munkálatok a II-es szakaszon lassan a vége felé közelednek. Teljes mértékben befejeződtek a szegélyépítési, zárt, és nyílt vízelvezetési, valamint aszfaltos építési munkálatok. A kivitelező folyamatosan végzi az útpályán kívüli szegélyek melletti zöldterületek, és a zárt vízelvezetés miatt felbontásra került egyéb területek rendbetételét földfeltöltéssel, füvesítéssel, valamint szükség szerint burkolat helyreállítással.

Az építési szakaszon megszűntek a kivitelezési időszakban előforduló ideiglenes lezárások, forgalomterelések, az átépített közút immár teljes mértékben a közlekedők rendelkezésére áll.

Az útpályát érintően már csak kerékpársáv útburkolati jeleinek festési munkálatai vannak vissza, mely a Ny-i Strand K-i része és Balatonszárszó közigazgatási határa között fog megtörténni a tervezettnél megfelelően.

A II ütem kivitelezési munkálatainak műszaki átadása az érvényes építési szerződésekben meghatározottaknak megfelelő időpontra meg fog történni.

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

2011. november



A kerékpárút útépitési munkái a tervezetteknek megfelelően befejeződtek. A kivitelező készre jelentését követően az elkészült munkák műszaki átadás átvétele 2011. december 08-án eredményesen megtörtént.

Az kerékpárút építés I. szakaszán (Szántód és Széchenyi utca között) a módosított és engedélyezett csapadékvíz elvezetési tervek alapján megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Tekintettel a Balaton alacsony vízállásra a Bajcsy Zs. utcától kezdődő kivitelezés egyharmad részén víztelenítés nélkül ment a munkavégzés, a vissza lévő

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006

többi szakaszon, viszont az egyre növekvő fektetési mélység miatt már talajvízszint süllyesztést kellett alkalmazni. A kivitelező fentiek ellenére a csővezeték fektetési munkálatokat határidőre elvégezte, melynek eredményes műszaki átadás-átvétele 2011. december 30-án megtörtént.

A kerékpárút ünnepélyes átadására 2011. december 22-én került sor.

A műszaki átadási eljárásokat követően megindítottuk a beruházás műszaki lezárásához szükséges forgalombehelyezési, valamint vízügyi üzemeltetési engedélyek megadására vonatkozó kérelmeket. Amint ezen eljárások befejeződnek, és megkapjuk a szükséges engedélyeket, úgy az elkészült létesítményeket hivatalosan is használatba vehetik a közlekedők. Meglátásunk szerint a téli időjárási körülmények lezáródásának idejére, a hó elolvadására, a szükséges engedélyeket megkapjuk, és így a közlekedők teljes jogúan birtokba vehetik az elkészült létesítményt.

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



## „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006



**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.





„A BALATONI BRINGAKÖRÚT  
BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE”

DDOP – 2.1.1/D-09-2010-0006



*2011. december*

**Közreműködő szervezet:**

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.
